


Kvalitetssikring

Ikke bærende indervægge med stålskelet

04/2026

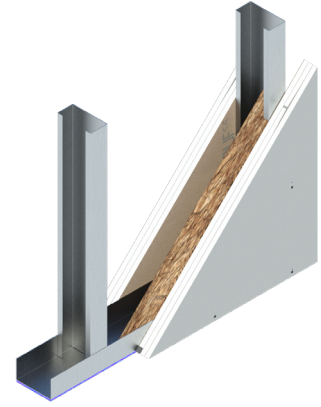

Principskitse

Generelt

Følgende punkter bør kontrolleres i henhold til udbudsmaterialet.

Placering

- Vægplacering.
- Dørplacering.

Stålskelet

- Stolpe- og skinnedimensioner.
- Skinner fastgøres pr. 600 mm.
- Stolper monteres normalt i henhold til vægtype pr. 450 mm.
- Der monteres polyethen ved tilslutning mod andre bygningsdele.
- Omkring døre forstærkes med karmstolper, forstærkningsprofiler eller træ i hele væghøjden.
- Karm- og forstærkningsstolper monteres med forstærkningsvinkler.

Hulrumsisolering

- Lyd-, brand- eller varmeisolering.
- Isoleringsmaterialet må ikke trykke på gipspladerne.

Gipsplademontage

- Gipsplader, type og antal pladelag.
- Ved flere pladelag forskydes samlingerne. Åbning i samling maks. 4 mm.
- Pladesamlinger i flugt med åbninger må ikke forekomme.
- Båndstål / TSKA i kortkantsamlinger.

Fastgørelse af gipsplader

- Skruetyper.
- Skruer holdes 10-15 mm fra langkanter.
- Skruer holdes 15-20 mm fra kortkanter og skårne kanter.
- Skrueafstand.
- Skruer undersænkes 0,5-1,0 mm.

Fugning

- Lydfuger i første pladelag kontrolleres for tæthed.

Hjørne og afslutninger

- Hjørnebeskyttere fastgøres pr. 150 mm med Clinch-on. Andre profiltypen monteres i.h.t. profilets montagevejledning.
- Spartelprofiler skal slutte tæt mod underlag og skal monteres med huller mod rummet.

Færdig vægoverflade

- Planhedstolerancer defineres. Hvis ikke noget er nævnt forventes kvalitetsniveau Q2.



Kontrolskema - Ikke bærende indervægge m. stålskelet

Sag:								
Bygning:				Etage:				
Specifikation af bygningsdel:								
Omfang af kontrol:		Tolerancekrav						
		Afsætning (opmærkning) (±) mm: _____						
		Planhed, færdig gulv/loft (±) mm: _____						
Kontrol udføres ved: M: Måltagning V: Visuel (foto) registrering		Accept Kryds af		Kontrolleret		Bemærkninger	Udbedret	
		Ja	Nej	Dato	Sign.		Dato	Sign.
Placering								
Vægplacering	M							
Dørplacering	M							
Stålskelet								
Underlagsplanhed	M							
Skinnemontage	M							
Stolpeafstand	M							
Stolpesamlinger	M							
Polyethen montage	V							
Dørforstærkning	V							
Hulrumsisolering								
Type og mængde	V							
Tilskæring	V							
Gipsplademontage								
Type og antal pladelag	V							
Forskudte pladesamlinger	V							
Pladesamlinger omkring døre	V							
Båndstål/TSKA i kortkantsamlinger	V							
Fastgørelse af gipsplader								
Skrueafstande	M							
Skrueundersænkning	V							
Fugning								
Lydfuger	V							
Hjørner og afslutninger								
Hjørnebeskytter, montage	M							
Øvrige profiler	-							
Færdig vægoverflade (+ spartling)								
Planhedstolerancer	M							
Andet								
	-							
Endelig accept								
Dato:				Ansvarlig for kvalitetssikring, underskrift:				
